

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team:

Onderwerp:

Prioritering projecten februari 2025

Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 4-03-2025
Notanummer	: 2025-170
Datum	: 4-03-2025
Programma	: 05 - Ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder	: Wethouder Wijnhoud,
Bijlage(n)	: Bijlage def raad-lijst lopende projecten feb 2025.docx,def analyse capaciteit 2025.pdf,def prioriteiten wachtlijst feb 2025.xlsx

Parafering

26-02-2025: Wethouder26-02-2025: Programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Agendering

- * 27-02-2025: Gemeentesecretaris/algemeen directeur
- * 27-02-2025: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

Definitieve akkoord

4-03-2025

B & W d.d.: 4-03-2025

Besluit

1. De wachtlijst prioriteiten vast te stellen
2. De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad inclusief de bijlage 'lijst lopende projecten feb 2025'

De nota en het besluit openbaar te maken

Inleiding

Een groot aanbod aan projecten en een gebrek aan voldoende ambtelijke uitvoeringscapaciteit, dwingen de gemeente Deventer keuzes te maken. In 'juli 2024 ontving de raad, na besluitvorming in het college, een lijst met geprioriteerde projecten. Het college heeft aangegeven regelmatig van advies te willen worden voorzien over de inzet van capaciteit voor projecten.

Het college heeft als vertrekpunt meegegeven dat de volgende projecten voorrang krijgen:

- * Lopende projecten
- * Voorkeursrechttrajecten
- * Versnellingsgelden
- * MJOP

In de bijlagen treft u een geactualiseerde lijst van projecten aan die op dit moment gekoppeld zijn aan capaciteit belegd bij de teams Projecten (PRO). Deze (blauwe) lijst is ingedeeld in de 4 bovengenoemde voorrangscategorieën. De projecten op deze lijst zullen worden afgemaakt. Daarnaast treft u de

geactualiseerde wachtlijst met projecten aan. Sinds de vorige prioriteitenlijst van juli 2024 is ongeveer $\frac{3}{4}$ van de projecten met prioriteit 1 opgepakt. De projecten die sinds juli 2024 op de lijst staan en nog niet opgepakt werden zijn opnieuw meegenomen in de wachtlijst. Deze wachtlijst is door programmamanagement geprioriteerd op basis van beschikbaarheid van financiële middelen, politiek belang, urgentie, vervolg op lopende projecten en samenhang met andere projecten en programma's. De projecten met nummer 1 hebben de hoogste prioriteit toegekend gekregen. Tot slot zitten er een capaciteitsraming bij de stukken.

Uit de capaciteitsanalyse valt te concluderen dat met de lopende projecten de huidige beschikbare capaciteit volledig is gevuld. Er ontstaat medio 2025 en richting het derde kwartaal van 2025 weer ruimte, omdat een aantal lopende projecten dan waarschijnlijk zal zijn afgerond. Deze ruimte ontstaat vooral bij het team PRO/WG (wonen en gebiedsontwikkeling). Bij PRO/EL (Energie en Leefomgeving) ontstaat die ruimte niet groei in fte's.

Tussentijds kan mogelijk extra ruimte ontstaan als externe factoren (netcongestie, nieuwe wetgeving of bezwaren) de voortgang vertragen en tijdelijk minder of andere inzet op lopende projecten nodig is.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het college prioriteert in de voorliggende ambities en projecten om deze zo efficiënt en effectief mogelijk te realiseren.

Kader

- * Bestuursakkoord Dichtbij, betrokken en bevlogen
- * Begroting 2024
- * Raadsmededeling 2023-201 prioritering projecten
- * B&W nota 2023-201 prioritering projecten
- * Raadsmededeling 2024-594 prioritering projecten
- * B&W nota 2024-594 prioritering projecten

Betrokken partijen en participatie

N.v.t., interne afwegingen op basis van criteria.

Toelichting op participatiebeleid

-

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor:

1. Na de eerste helft van 2025 komt er geleidelijk weer ruimte in de uitvoeringscapaciteit. Het is belangrijk om nu te bepalen welke nieuwe projecten dan kunnen worden opgepakt. De juiste capaciteit kan worden gezocht en er kan worden gewerkt aan de opdrachtformulering.
2. De nieuwe wachtlijst prioriteiten geeft aan wat de afwegingen van programmamanagement zijn geweest in de prioritering van de verschillende projecten.

Argumenten tegen:

1. Buiten de lijst van lopende projecten en de wachtlijst prioriteiten wordt er in de gemeente nog gewerkt aan inbreidingslocaties en aan planologische procedures in het buitengebied zoals Rood voor Rood projecten, en Kansen uit Buiten die geen onderdeel uitmaken van het overzicht. Deze projecten kennen een aparte wachtlijstsystematiek met een eigen afweging en leggen ook beslag op de uitvoeringscapaciteit bij de teams met projectleiders.

2. Afgelopen periode zijn een aantal projecten opgepakt zonder een integrale afweging door programmamanagement vanwege urgentie of politiek belang. Er zal altijd een mate van flexibiliteit moeten bestaan om acute projecten te kunnen oppakken. Voorbeelden zijn Verkenningen die voortkomen uit Wonen Ruimte Stad, Demping derde havenarm, Waterstofontwikkeling en Nieuwbouw Collectie Overijssel. Deze projecten staan op de lijst met lopende projecten en zijn in rood opgenomen.

3. De capaciteit van de benodigde disciplines bij teams Inrichting Beheer Leefomgeving (IBL) is nog niet altijd geraamd. Bijvoorbeeld voor civiele projecten in het kader van de versnellingsgelden zal niet direct ruimte ontstaan bij de civiele medewerkers.

4. Er is nu gekozen om de actualisatie uit te voeren overeenkomstig de aanpak van de prioriteitenlijst van juli 2024. De niet fysieke projecten worden nu niet door de afdelingen Projecten Wonen en Gebiedsontwikkeling en Projecten Energietransitie en Leefomgeving (PRO WG en PRO EL) opgepakt. Nieuw is dat de behoefte dit keer wel opgehaald en inzichtelijk gemaakt in de wachtlijst. Echter deze projecten zijn niet op capaciteit doorgerekend.

5. De organisatieontwikkeling gaat leiden tot andere sturing op het werkproces van prioriteren. Het werkproces zal opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden met de nieuwe intern belanghebbenden. Ook blijft de intake van nieuwe projecten discipline vragen.

6. Om in de toekomst de prioritering van projecten goed af te wegen is een helder werkproces nodig voor de intake van nieuwe projecten en meer discipline bij alle interne belanghebbenden (Team-, Programma- en Regiemanagers, directie en college).

Financiële consequenties en dekking

N.v.t.

Openbaarmaking en communicatie

-

Aanpak en uitvoering

Als de wachtlijst prioriteiten is vastgesteld kan gestart worden met de voorbereiding van de voor 2025 geprioriteerde projecten.

RAADSMEDEDELING

Onderwerp	Prioritering projecten februari 2025		
Nummer	2025-170	Portefeuillehouder	Wethouder Wijnhoud,
Team	DEV-BLD-R	Datum	4-03-2025

Inleiding

Een groot aanbod aan projecten en een gebrek aan voldoende ambtelijke uitvoeringscapaciteit, dwingen de gemeente Deventer keuzes te maken. In juli 2024 ontving de raad, na besluitvorming in het college, een lijst met geprioriteerde projecten. Het college heeft als vertrekpunt aan de ambtelijke organisatie meegegeven dat de volgende projecten voorrang krijgen:

- * Lopende projecten (worden afgemaakt)
- * Voorkeursrechttrajecten
- * Versnellingsgelden woningbouw
- * Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)

De projecten in deze 4 categorieën treft u aan in de bijlage en betreft een actualisatie van de lijst van vorig jaar.

Kader

- * Bestuursakkoord Dichtbij, betrokken en bevlogen
- * Begroting 2024
- * Raadsmededeling 2023-201 prioritering projecten
- * B&W nota 2023-201 prioritering projecten
- * Raadsmededeling 2024-594 prioritering projecten
- * B&W nota 2024-594 prioritering projecten

Kern van de boodschap

Krapte op de arbeidsmarkt en een te groot aanbod aan projecten dwingen de gemeente om te prioriteren. Het college heeft daarom een actueel overzicht gemaakt van projecten die momenteel lopen en waar capaciteit voor beschikbaar is gemaakt. Deze (lijst lopende projecten februari '25) treft u aan in de bijlagen.

Daarnaast concludeert het college dat op basis van capaciteitsramingen er pas medio / derde kwartaal van 2025 additionele projecten kunnen worden uitgevoerd, omdat met de lopende projecten de huidige beschikbare capaciteit is gevuld. Er ontstaat tweede helft 2025 geleidelijk weer ruimte, omdat een aantal projecten dan waarschijnlijk zal zijn afgerond.

Nadere toelichting

Op basis van een grove raming kan een deel van de hoogste prioriteiten op de wachtlijst opgepakt worden. Daarbij wordt uitgegaan van een gestage groei aan invulling van fte's bij de Afdelingen Projecten. Aangezien de werklast bij projectleiders van civiele projecten het hoogste is, zullen deze projecten het minst snel kunnen worden opgepakt.

Projecten met de hoogste prioriteit op de wachtlijst:

- * Wijkuitvoeringsplan Warmtetransitie Deltabuurt
- * Wijkuitvoeringsplan Warmtetransitie Keizerslanden
- * Uitvoering Klimaatraadadviezen afhankelijk van perspectiefnota
- * Procesregiseur smart energy hubs
- * Versnellen realisatie 3e Hoog- en Middenspanningsstations en ondergronds brengen bekabeling
- * Projectleiding locatie opvang AMV/Multifunctioneel
- * Procesbegeleiding Verkenning Stadsland
- * Projectleiding mobiliteitsplan Binnenstad en Periferie
- * Projectleiding haalbaarheidsstudie sportpark Rielenenk

- * Onder 1 dak
- * Vervanging Prins Bernard Sluis
- * Planvorming (realisatiefase) Internationale Schakelklas

Overige projecten op de wachtlijst:

- * Solar carport Borgelerbad
- * Netbewust bouwen
- * Duurzaamheidskader
- * Regionale Woonzorgvoorziening Brink, realisatiefase
- * Verplaatsing van het Groenbedrijf
- * Projectleiding uitvoeringsplan vluchtelingen/ diversen
- * Vezelvalei project regiodeal, haalbaarheid innovatiecentrum en kwartiermaken
- * Poort van Deventer infra 2 (van 2x2 naar 1x2)
- * Snijpelingsdijk – Wilhelminabrug
- * Reconstructie kruising Brinkgreverweg/Veenweg
- * Jsselfront
- * Onderzoeken zelfleveringsmodel energie gemeente
- * Toekomstplan Deltaplein/Rivierenwijk
- * Uitvoering Plan van aanpak circulariteit
- * Onderzoek invulling samenpand (voedsel- speelgoed-kledingbank)
- * Ontwikkeling en realisatie nieuw bedrijventerrein
- * Herstructurering Kloosterlanden-Oost
- * Openbare ruimte Senzora/Sluiskwartier

Projecten op de wachtlijst waar de Afdelingen Projecten niet primair aan zet zijn:

- * Procesondersteuning Omgevingsvisie

Hoewel de lijst richting geeft aan de capaciteitsraming voor projecten, blijkt in praktijk dat er soms flexibiliteit moet zijn om niet geplande, maar acute projecten op te pakken. Voorbeelden hiervan zijn de locatie verkenningen in het kader van Wonen Ruimte Stad. Dit betekent vaak dat andere projecten langer op de wachtlijst blijven staan. Ook kunnen sommige projecten worden uitbesteed, hoewel dat niet het uitgangspunt is van het college.

Buiten de lijst van lopende projecten en de wachtlijst wordt er binnen de gemeente nog gewerkt aan inbreidingslocaties en aan planologische procedures in het buitengebied zoals Rood voor Rood, en Kansen uit Buiten die geen onderdeel uitmaken van het overzicht. Hier zijn specifieke collega's bij betrokken die met een vast proces ervoor zorgen dat initiatieven hiervoor opgepakt kunnen worden. Voor deze projecten bestaat een aparte wachtlijstsystematiek met een eigen afweging.

Lopende projecten	Voorkeursrecht en voorbereidingsbesluit	Vernellingsgelden	MJOP	
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	Boothelling Brandweer bij hoogwater			
Programma 3 Leefomgeving	Bewonersinitiatief P de Hoogstraat-V. Vlotenlaan Herinrichting triple B-pleinen incl. Brink Bathmen Invoering boomkroonmonitoring Aanpak boomwortelopdruk Fietspad Oostermaatsdijk Outdoor Freerunpark Verlichting en bewegwijzering i.h.k.v. Binnenstadsagenda Beheerplan haven, kademuuren en beschoeiing beheer Buurtaanpak Zandweerd noord Buurtaanpak de Marken (nazorg) Buurtaanpak Rivierenwijk Buurtaanpak Tuindorp (gereed) Civiele bruggen en kunstwerken beheer Route Huize Salland-De Flora WC Vijfhoek kwaliteitsimpuls		Fietsvoorziening (Brinkgreverweg/Rielerweg) Fietsvoorziening (maatregelen speedpedelecs)	2024- 2025 jaarschijven Rivierenwijk Asfaltprojecten Esdoornsingel Langs de Wetering Noorwegenstraat Planuitwerking Projectmanagement infra Radboudlaan Rubenstraat (afgerond) MJOPs pijplijn 2023 ev. MJOPs 2023 uit MJOP-MiND MJOP-MIND 2024-2027 Omvormen naar beton Spanjaardsdijk deel 2 Zandweerd 1 Herinrichting Weseperstraat

	<p>Fietspaden langs A1</p> <p>Fietspaden Rembrandtkade</p> <p>Fietspaden Spanjaardsdijk - Realisatie</p> <p>Fietsparkeren binnenstad</p> <p>Zutphenseweg/Deensestraat</p> <p>Lebuinuspleinen (gereed)</p> <p>N348 Noord Raalte/Overijssel</p> <p>N348 zuid Epse/Gelderland</p> <p>NABO - Overwegen / Diepenveen (gereed)</p> <p>Nieuwe Markt</p> <p>Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Binnenstad</p> <p>Rielerkolk waterkwaliteit (nazorg)</p> <p>Roessinkweg – Realisatie</p> <p>rotonde Hoge Hondstraat – Ceintuurbaan (gereed)</p> <p>Uitvoering verlichtingsplan</p> <p>Verbreiding A1 omgevingsmanagement (gereed)</p>			
--	--	--	--	--

	Vervanging houten bruggen (nazorg)			
	Vliegend Hert/Atalanta (nazorg)			
	Blankenheimstraat			
	Montestraat			
	Bourgondiëstraat			
	Kolkmansweg			
	Dunantlaan			
	Voorstad wateroverlast			
	Groenblauwe hoofdstructuur			
	Visie Leefomgeving			
	Groenplan binnenstad			
	Poort van Deventer infra 1 Teugseweg (van de wachtlijst)			
	Ontwikkelperspectief N337-zone			
	Overstortleiding Maagdenburgstraat			
	Verbeteren verkeersveiligheid Storminkstraat			
	Buurtaanpak Noorderenk (Bathmen)			
	G. van Swietenstraat			

	<p>Laarmanskamp</p> <p>Marienburgstraat</p> <p>Voetpad Colmschate</p> <p>Waterpasserende bestrating</p> <p>Wayfinding, kwaliteitsimpuls binnenstad (ingepland)</p> <p>Wechelerweg</p> <p>DUVV Ceintuurbaan L. van Borgele</p> <p>DUVV Overstichtlaan Dreef</p>			
<p>Programma 4A Milieu en duurzaamheid</p>	<p>Afval en grondstoffen</p>			
<p>Programma 4b Energietransitie</p>	<p>Slim Warmtenet Zandweerd / warmtebedrijf</p> <p>Zandweerd stroomt</p> <p>DUP Bathmen</p> <p>Biogas Bathmen</p> <p>Windenergie clustergebied A1</p> <p>(verkenning) WUP Colmschate</p> <p>WUP De Worp</p> <p>WUP Deltabuurt</p>			

	<p>Energiekloet</p> <p>Burgerberaad / Klimaatraad</p> <p>Deventer Isolatie Plan</p> <p>Deventer Helpt Isoleren</p> <p>Soorten Management Plan (SMP)</p> <p>Grondgebonden zonneparken - (Borgelerbad ingepland)</p> <p>Opgave Netcongestie -Realisatie HS station -Realisatie MS/LS -Verslimmen</p> <p>Uitvoering plan van aanpak Circulariteit (van de wachtlijst)</p> <p>WUP Colmschate (van de wachtlijst)</p> <p>Waterstofontwikkeling</p>			
<p>Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling</p>	<p>Hoofdwegenstructuur en Mobiliteitsplan binnenstad</p> <p>Flexwonen algemeen + beoordelen locaties</p> <p>Wonen Ruimte Stad fase 3 afgerond</p> <p>Nul Emissie zone</p> <p>Melksterweide</p>			

	<p>Uitvoeringsagenda platteland Dorpen</p> <p>Routekaart Okkenbroek actualiseren</p> <p>Doffegnielaan</p> <p>WC Rivierenwijk</p> <p>Verkenning locatie 4b Bathmen</p> <p>Verkenning Baarlerhoek</p> <p>Verkenning Haveneiland</p> <p>Verkenning Vijfhoek Zuid-Oost</p>			
<p>Programma 6 Herstructurering en Vastgoed</p>	<p>Boxbergerweg Diepenveen</p> <p>Gasfabriek Asfaltcentrale opstellen SOK</p> <p>Aan de Dijk (incl brm wrm)</p> <p>Afgesloten complexen (incl Bergweide, Alferinklaan Bathmen, Lettele, Holterwegzone, Vijfhoek)</p> <p>Bedrijventerrein A1</p> <p>Centrumplan Bathmen</p> <p>Eikendal</p> <p>Hagenvoorde</p> <p>Herstructurering Rivierenwijk</p>	<p>Wechelerhoek</p>		

	<p>Reclamemast A1 bedrijvenpark Teugseweg (GREX)</p> <p>Shita terrein</p> <p>S-park HMO</p> <p>Steenbrugge</p> <p>Tuinen van Zandweerd</p> <p>WFS Containerterminal</p> <p>Wijtenhorst/Douweler Leide (alg/manege, kolkmansweg, Hofmeijerskamp)</p> <p>Lettele Oost</p> <p>Woningbouw in Loo</p> <p>Woningbouw Okkenbroek</p> <p>Melchior van Brielstraat Diepenveen</p> <p>Wittestein</p> <p>Zuidkant Bathmen, locatie 1 en 3 van de routekaart Bathmen</p> <p>Woertmansweg Bathmen, locatie 2 van de routekaart Bathmen</p> <p>Buurtschap Bathmen, locatie 4a van de routekaart Bathmen</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Flexwonen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anna Reynvaanstraat/Suze Groenewegstraat - Boxbergerweg Diepenveen - Overstichtlaan - David Wijnveldtweg - Charles Rochussenstraat - Steenbrugge (afgerond) 			
<p>Programma 8 Meedoen</p>	<p>Sporthal de Uutvlog (Bathmen)</p> <p>Renovatie de Scheg</p> <p>Kunstgras 2023</p> <p>Lettele sportvelden</p> <p>Opvang vluchtelingen Oekraïne/arbeidsmigranten</p> <p>Buurtvoorziening Oranjekwartier</p> <p>Tussenvoorziening Schalkhaar</p> <p>Regionale woonzorgvoorziening Gemeenschapsctr./ondersteuning eerste verkenning verplaatsing sporthal Schalkhaar</p> <p>Toekomstbestendige wijken</p>			


	<p>Opvanglocatie Tactus de Brink</p> <p>Beleidskader vluchtelingen</p> <p>Hanzeweg Huisvesting arbeidsmigranten</p> <p>Skaeve huuse (van wachtlijst)</p>			
<p>Programma 9 Jeugd en Onderwijs</p>	<p>Nieuwbouw Etty Hillesum</p> <p>Lettele nieuwbouw school/ sporthal</p> <p>Zwaluwenburg</p> <p>Snipperling nieuwbouw school VSO</p> <p>Arkelstein/Dreef (V7)</p> <p>Internationale schakelklas (haalbaarheid, van de wachtlijst)</p>			
<p>Programma 10A Economie en Internat beleid</p>	<p>TBBT Bergweide IV noord</p> <p>Havencoördinator</p> <p>Demping derde havenarm</p>			
<p>Programma 10B Kunst Cultuur</p>	<p>Podiumkunsten onder 1 dak</p> <p>Nieuwbouw Collectie Overijssel</p>			
<p>Gebiedsprogramma Centrumschil</p>	<p>Verzetslaan 20 (voormalig ABN AMRO)</p>	<p>Haveneiland incl. BP kavel</p>	<p>Actualisatie gebiedsprogramma inclusief Openbare ruimte stadscampus</p>	

	<p>Verzetslaan 30 (vml Rijksvastgoed)</p> <p>Herontwikkeling Topicus</p> <p>Kop Handelskade</p> <p>Post NL Mobiliteitshub de Kien/P+R; woningbouw & uitbreiding Aventus</p> <p>Volkstuinenlocatie</p> <p>Planontwikkeling Stadshof</p> <p>Broederenkwartier</p> <p>KPN locatie</p> <p>Wonen boven Winkels 2.0.</p> <p>Proosdijpassage</p> <p>HEMA-locatie</p> <p>RotoSmeets</p> <p>Havendame (Silo gebied)</p> <p>Woontoren Jansen de Jong (Ter Hoeven locatie)</p> <p>Vihamij locatie</p> <p>HGB Kavel</p> <p>Senzora</p>	<p>Bokkingshang (nav voorbereidingsbesluit)</p>	<p>Fiets en voetgangersverbinding Verzetslaan</p> <p>Fiets & Voetgangerstunnel Voorstad-binnenstad (Post NL)</p> <p>Bruggen over singel =realisatie 2 langzaam verkeersverbindingen tussen Handelskade en Verzetslaan en bij Roto</p> <p>Gebouwde Fietsvoorziening binnenstad bij Centrumgarage</p> <p>Auto & Fietsvoorziening (Handelskade)</p> <p>Mobiliteitshub Rotokwartier incl. parkeeropgave</p> <p>Brinkgreverspoorbrug</p>	
--	--	---	---	--

	<p>Sluiskwartier</p> <p>Smyrnastraat Tapijtfabriek</p> <p>Karwei locatie</p> <p>Scapino locatie</p>			
<p>Gebiedsprogramma Keizerslanden</p>	<p>Actualisatie gebiedsprogramma Ludgeruskwartier</p> <p>Marke Noord / Zuid woningbouw Fietsvoorzieningen Laan van Borgele (onderdeel van Marke Noord)</p> <p>WC Keizerslanden Roelandflat</p> <p>Marke Zuid sporthal</p> <p>Sportveld Boerhave</p> <p>Van Hetenstraat</p> <p>Geertruiden</p> <p>St Jozeflocatie</p> <p>Gooszenstraat 1</p> <p>Fietstunnel Karel de Grotelaan</p> <p>Karel de Grotelaan 2</p> <p>Ontwikkelperspectief N337-zone</p>	<p>Piekfijnplein</p>	<p>Stedenbouwkundig plan Hanzetrace</p> <p>Fietstunnel Hanzetrace Lebuinuslaan</p> <p>Capaciteitsverruiming Stadslint</p> <p>Uitvoeringskaders/Raamwerk Openbare Ruimte</p>	<p>Ludgeruskwartier</p> <p>Oranjekwartier</p>

Afgerond of bijna afgerond
Afgelopen periode opgepakt

Bestaande werkvoorraad PRO EL + WG

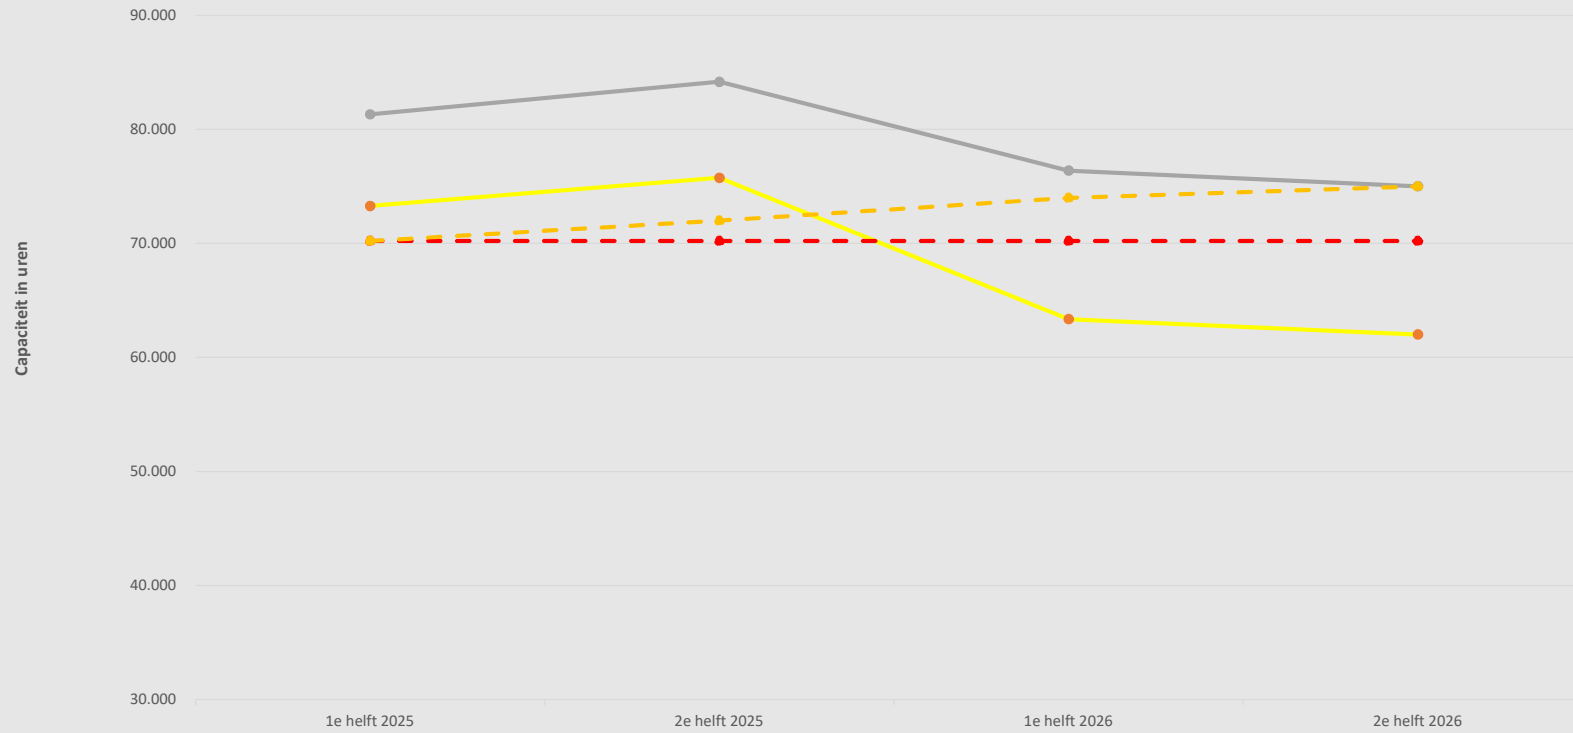

- lopende projecten feb 2025
- lopende projecten + wachtlijst feb 2025
- huidige beschikbaarheid team PRO
- toekomstige beschikbaarheid team PRO

Wachlijst Projecten																													
nieuwe projecten feb 2025:																													
										Wijkuitvoeringsplan Warmtetransitie Deltabuurt	x	x	x	x	1	x				x									
										Wijkuitvoeringsplan Warmtetransitie Keizerslanden	x	x	x	x	1	x				x									
										Uitvoering Klimaatradadviezen afhankelijk van perspectiefnota	x	x	x	x	1		x			x									
										Solar carport Borgelerbad	x				3			x		x									
										Procesregiseur smart energy hubs	x	x	x	x	1			x		x									
										Versnellen realisatie 3e hoog en middenspanningstations en ondergrondsbrengen bekabeling	x	x	x	x	1			x		x									
										Netbewust bouwen	x			x	2			x		x									
										Duurzaamheidskader	x			x	2		x			x									
										Regionale WoonZorgvoorziening Brink, realisatiefase		x	x	x	2		x			x									
										Projectleiding locatie opvang AMV/ multifunctioneel	x	x	x	x	1		x			x									
										Verplaatsing Het Groenbedrijf		x	x		2			x		x									
										Procesondersteuning Omgevingsvisie	x	x			2														
										Procesbegeleiding Verkenning Stadsland	x	x	x	x	1			x		x									
										Projectleiding mobiliteitsplan Binnenstad en Periferie	x	x	x	x	1		x			x									
										Projectleiding uitvoeringsplan vluchtelingen / diversen	x	x		x	2		x			x									
										Projectleider haalbaarheidsstudie sportpark Rielerenk	x	x	x		1			x		x									
										Vezelvallei project regionale haalbaarheid, innovatiecentrum en kwartiermaken	x		x		2			x		x									
										Onder 1 dak	x	x	x	x	1		x			x									
										Planvorming (realisatiefase) Internationale Schakelklas	x	x	x	x	1		x			x									
projecten die nog niet ingevuld zijn van wachlijst juli 2024:																													
										Poort van Deventer infra 2 (van 2x2 naar 1x2)		x			2		x			x									
										Snipperlingsdijk - Wilhelminabrug	x			x	2		x			x									
										Reconstructie kruising Brinkgreverweg/Veenweg	x			x	2		x			x									
										IJsselfront					3			x		x									
										Onderzoeken zelfleveringsmodel energie gemeente	x				3			x											
										Toekomstplan Deltaplein/Rivierenwijk				x	3			x		x									
										Onderzoek invulling Samenpand (voedsel- speelgoed- kledingbank)	x	x	x		2		x			x									
										Vervanging Prins BernhardSluis	x	x		x	1		x			x									
										Ontwikkeling nieuw bedrijventerrein		x	x		1		x			x									
										Herstructurering Kloosterlanden - Oost	x	x	x		2		x			x									
										Openbare ruimte Senzora / Sluiskwartier			x		2		x			x									
Strategisch doel: 2020/2021	Ruimtelijke Ontwikkeling									X										Atweging									
	Kunst en Cultuur																												
	Leefomgeving																												
	Werk en inkomen																												
	Meedoen																												
Milieu en Duurzaamheid en Energietransitie									maatschappelijke opgave																				
Economie en International																													
Openbare orde en veiligheid																													
Jeugd en Ondervijns																													
Burger en Bestuur																													
										Samen maken we deventer																			
										Fijn wonen en leven	x	x	x																
										Iedereen doet er toe				x	x														
										Een duurzame toekomst	x																		

Financiële middelen beschikbaar binnen begroting?

Politieke gevoeligheid

Urgentie

Logisch vervolg op reeds geprioriteerd project

Veel samenhang met andere projecten

Prioriteit

Vraagt veel capaciteit? (> 4 d / wk)

Vraagt gemiddelde capaciteit (2-3 d/wk)

Vraagt minder capaciteit? (<1 d/ wk)

Lang lopend project? (> 1 jaar)

Kort lopend project (< 1 jaar)
